Sample Time-Line
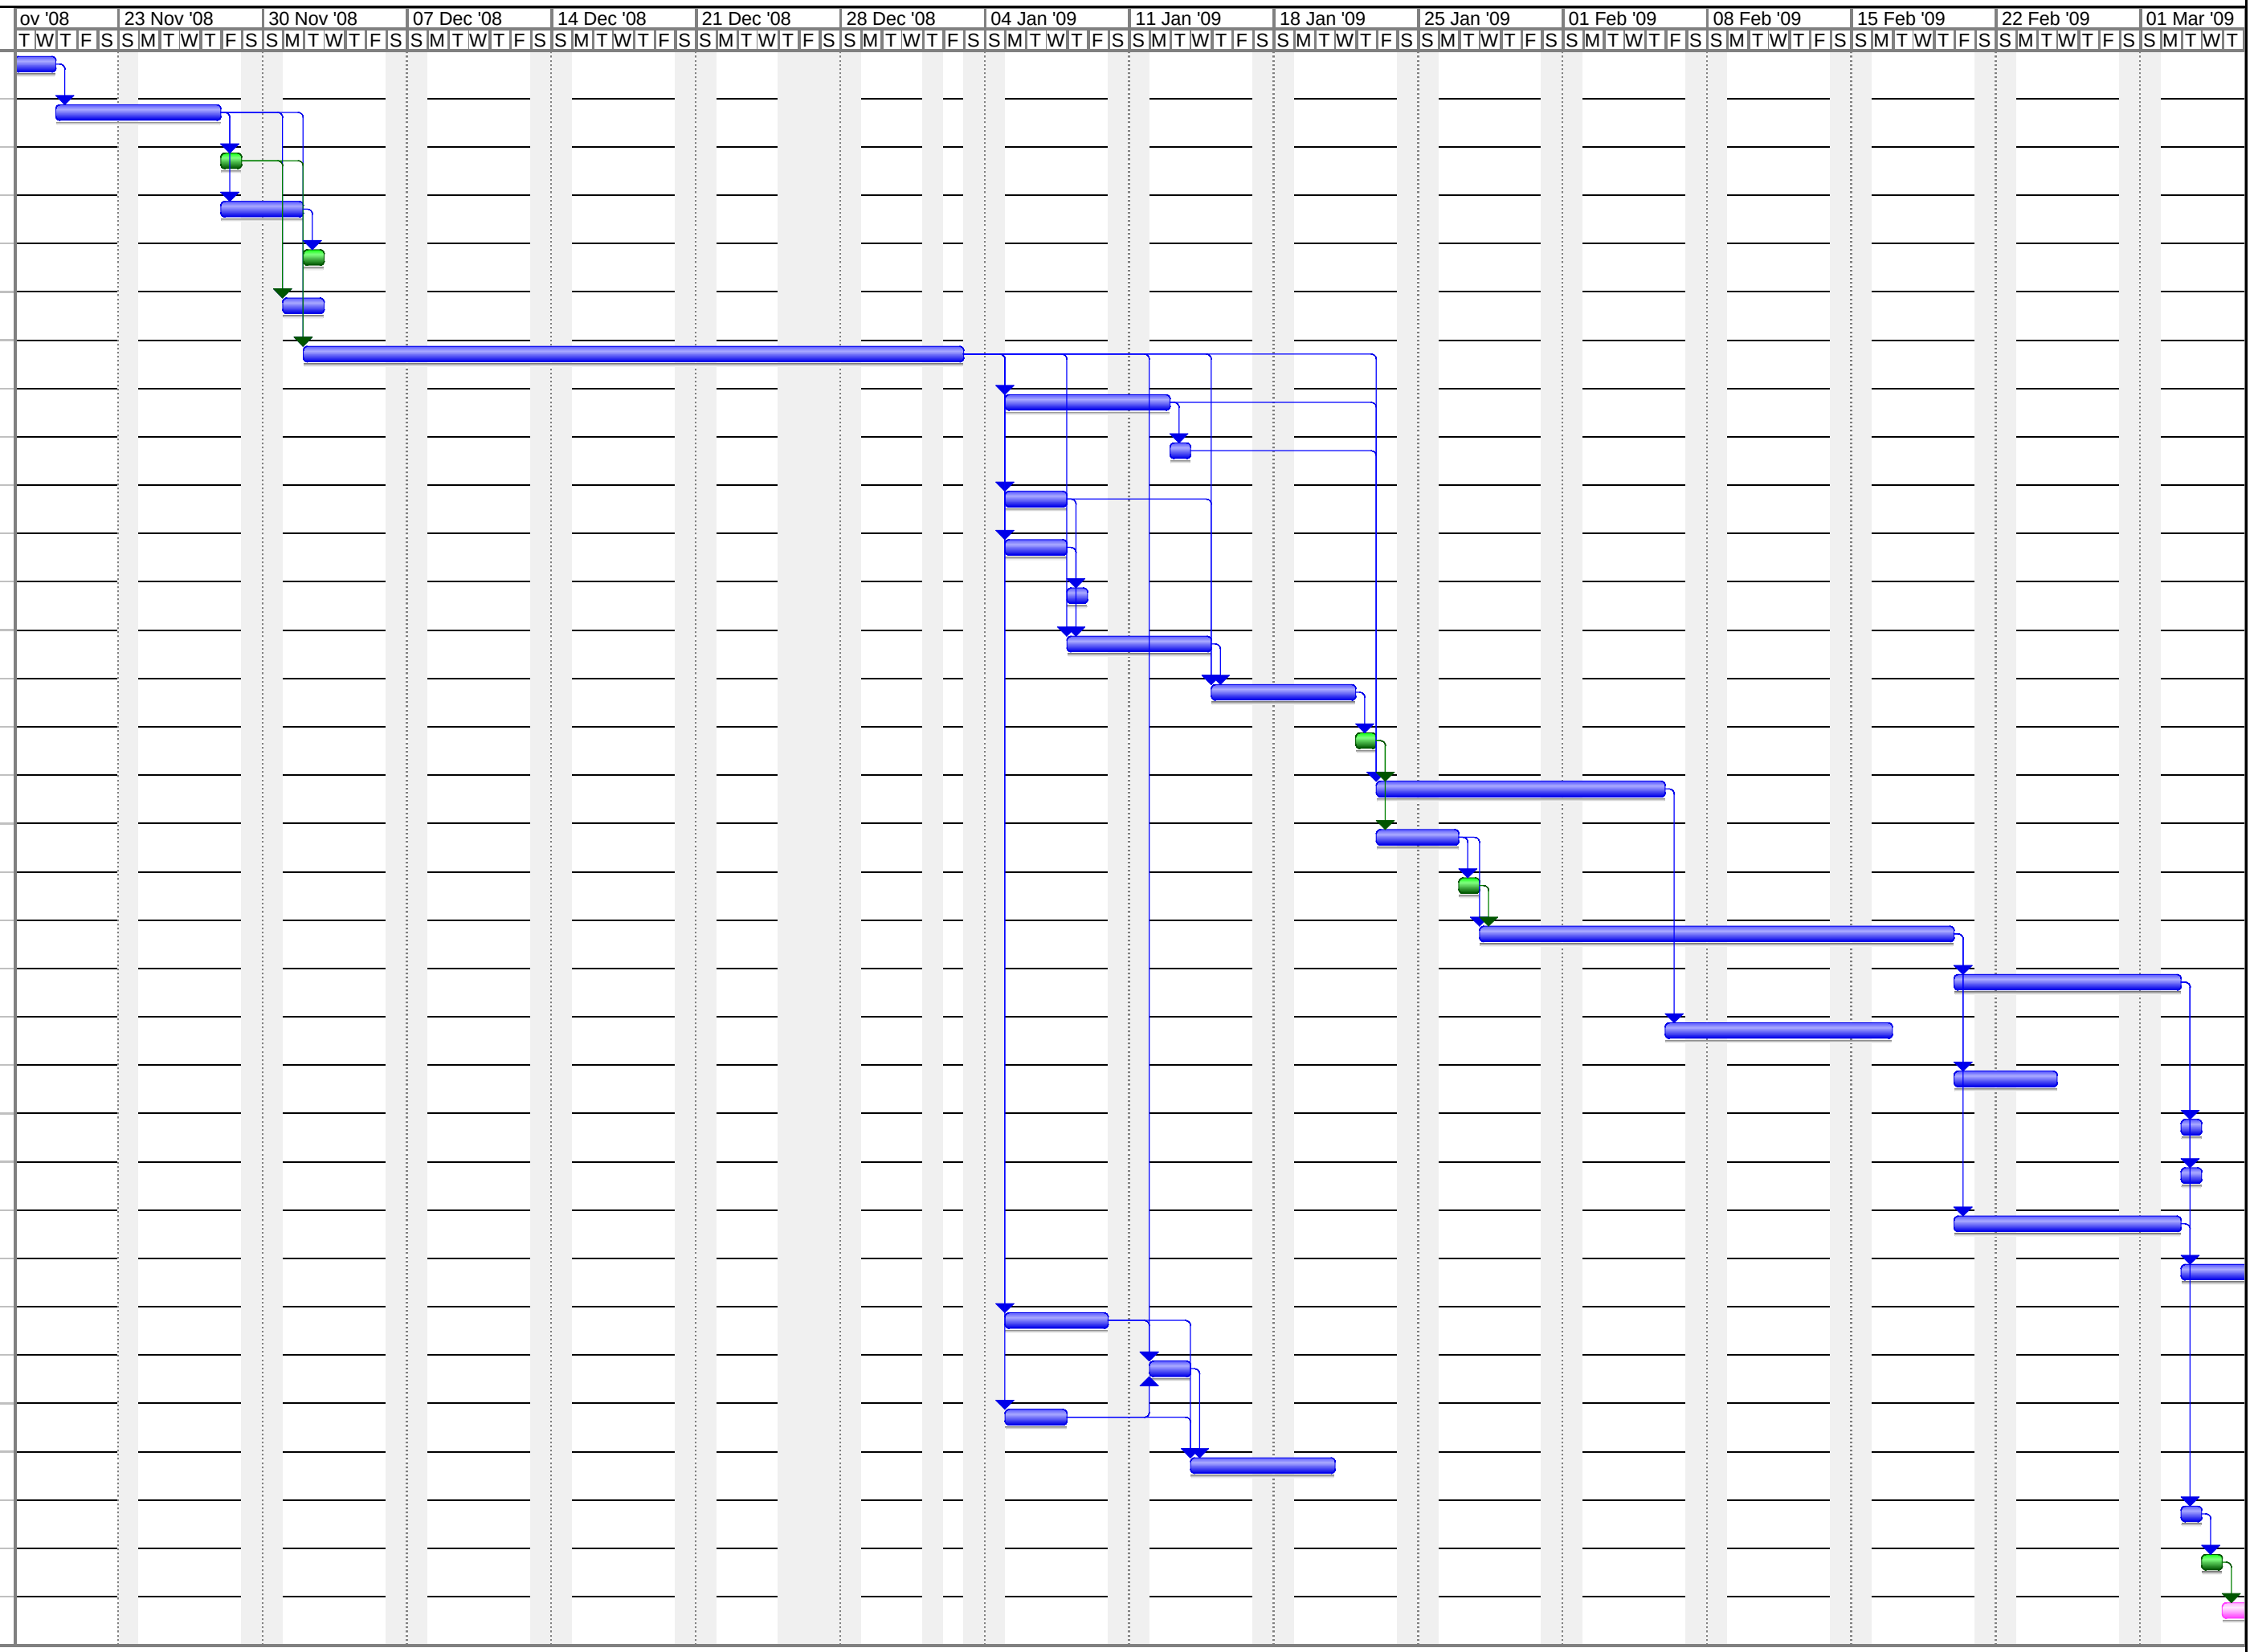
ID	Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessors
1	**Excavation**	2 days	Tue 18/11/08	Wed 19/11/08	
2	**Foundation**	7 days	Thu 20/11/08	Thu 27/11/08	1
3	**Inspection**	**1 day**	**Fri 28/11/08**	**Fri 28/11/08**	**2**
4	**Perimeter Drains**	2 days	Fri 28/11/08	Mon 01/12/08	2
5	**Inspection**	**1 day**	**Tue 02/12/08**	**Tue 02/12/08**	**4**
6	**Slab**	2 days	Mon 01/12/08	Tue 02/12/08	2,3
7	**Framing**	21 days	Tue 02/12/08	Fri 02/01/09	2,3
8	**Decks**	6 days	Mon 05/01/09	Mon 12/01/09	7
9	**Vinyl Decking**	1 day	Tue 13/01/09	Tue 13/01/09	8
10	**Seismic**	3 days	Mon 05/01/09	Wed 07/01/09	7
11	**Roofing**	3 days	Mon 05/01/09	Wed 07/01/09	7
12	**Gutters/ Downspouts**	1 day	Thu 08/01/09	Thu 08/01/09	11
13	**Plumbing Rough-in**	5 days	Thu 08/01/09	Wed 14/01/09	7,10
14	**Electrical Rough-in**	5 days	Thu 15/01/09	Wed 21/01/09	7,10,13
15	**Inspection**	**1 day**	**Thu 22/01/09**	**Thu 22/01/09**	14
16	**Exterior Finish**	10 days	Fri 23/01/09	Thu 05/02/09	7,15,8,9
32	**Insulation**	2 days	Fri 23/01/09	Mon 26/01/09	15
33	**Inspection**	**1 day**	**Tue 27/01/09**	**Tue 27/01/09**	32
34	**Drywall**	17 days	Wed 28/01/09	Thu 19/02/09	33,32
35	**Painting Interior**	7 days	Fri 20/02/09	Mon 02/03/09	34
37	**Painting Exterior**	7 days	Fri 06/02/09	Mon 16/02/09	16
38	**Cabinets/ Countertops**	3 days	Fri 20/02/09	Tue 24/02/09	34
39	**Electrical Finish**	1 day?	Tue 03/03/09	Tue 03/03/09	35
40	**Plumbing Finish**	1 day?	Tue 03/03/09	Tue 03/03/09	35
41	**Interior Finish**	7 days	Fri 20/02/09	Mon 02/03/09	34
42	**Flooring**	5 days	Tue 03/03/09	Mon 09/03/09	41
43	**Driveways/ Sidewalks**	5 days	Mon 05/01/09	Fri 09/01/09	7
44	**Irrigation**	2 days	Mon 12/01/09	Tue 13/01/09	7,43,45
45	**Fencing**	3 days	Mon 05/01/09	Wed 07/01/09	7
46	**Landscaping**	5 days	Wed 14/01/09	Tue 20/01/09	43,44,45
47	**Final Cleaning**	1 day	Tue 03/03/09	Tue 03/03/09	35
48	**Final Inspection**	**1 day**	**Wed 04/03/09**	**Wed 04/03/09**	47
49	**Celebration**	14 days	Thu 05/03/09	Tue 24/03/09	48
